

# PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES, EN FORMA MANUAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y SUS COLONIAS. PERIODO: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016

No	CANAL ARROYO Y/O VASO REGULADOR	LONG.	PERIODO DE TRABAJO	AVANCE %	VOLUMEN EXTRAÍDO (M <sup>3</sup> )	VOLUMEN EXTRAÍDO (TON.)
1	VILLA LAS FUENTES, CANAL REVESTIDO FRACC. VILLA LAS FUENTES	180 M. L.	01 AL 05 DE JULIO	100%	42	81
2	CANAL SAN JOSÉ CALLE MÉDICOS - GEÓGRAFOS - MÉDICOS - CHINA GAVIOTAS SUR, SECTOR SAN JOSÉ	225 M. L.	06 AL 20 DE JULIO	100%	51	106
3	CANAL REVOLUCIÓN AL FINAL DE LA CALLE REVOLUCIÓN COL. ATASTA	400 M. L.	12 AL 21 DE JULIO	100%	32	65
4	CANAL CHAMACO LEIVA, COL. GAVIOTAS NORTE	180 M. L.	18 AL 22 DE JULIO	100%	52	120
5	CANAL LAGUNA DEL ESPEJO COL. MIGUEL HIDALGO	160 M. L.	21 AL 27 DE JULIO	100%	46	88
6	DUCTO CUADRADO DE CONCRETO PLUVIAL, ALFONSO VICENS SALDIVAR, COLONIA GAVIOTAS NORTE - MANGA I	470 M. L.	21 AL 27 DE JULIO	75%	65	130
7	CANAL REINO UNIDO CALLE LUXEMBURGO-IRLANDA COL. GAVIOTAS SUR	500 M. L.	28 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO	100%	45	92
8	CANAL MANGA III	800 M. L.	28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO	100%	10	22
9	CANAL PLUVIAL DEL CÁRCAMO LIBERTAD COL. TAMULTE	300 M. L.	28 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO	100%	25	55
10	CANAL OCEANOLOGOS COL. GAVIOTAS SUR	600 M. L.	09 AL 13 DE AGOSTO	100%	20	42
11	CANAL PLUVIAL COL. ÁGUILA	900 M. L.	09 AL 13 DE AGOSTO	100%	15	32
12	CANAL AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. GAVIOTAS NORTE	155 M. L.	11 AL 17 DE AGOSTO	100%	13	28
13	CANAL JOSÉ MORENO IRABIEN, COL. PRIMERO DE MAYO	50 M. L.	11 AL 17 DE AGOSTO	80%	14	30
14	CANAL AV. CESAR A. SANDINO, COL. PRIMERO DE MAYO CANAL BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. PRIMERO DE MAYO CANAL ATRÁS DEL FOVISSTE I, COL. FOVISSTE I	320 M. L.	11 AL 24 DE AGOSTO	50%	21	45
15	CANAL A CIELO ABIERTO EJERCITO MEXICANO CALLES 27 DE FEBRERO COL. ATASTA	60 M. L.	28 DE SEPTIEMBRE	70%	6	12
	TOTAL	5,300 M. L.			457	948

# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL REVESTIDO DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS FUENTES

Fecha de inicio: **01 de Julio de 2016**  
Fecha de Conclusión: **05 de Julio de 2016**  
Longitud del canal: **180 Mts.**  
Avance: **100%**  
Volumen Desazolvado: **42 M<sup>3</sup>**  
Equivalente a **07** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>  
Beneficiando a **5,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLOLONIA VILLA LAS FUENTES



Antes




Proceso



Proceso  SAS  
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL REVESTIDO DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS FUENTES

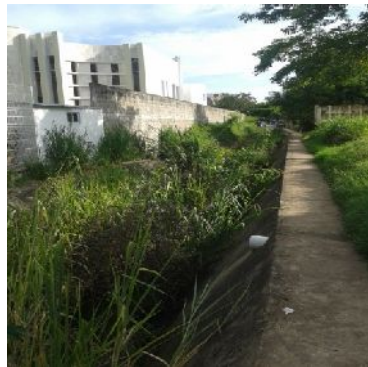

# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL SAN JOSÉ CALLE MÉDICOS - GEÓGRAFOS - MÉDICOS - CHINA GAVIOTAS SUR, SECTOR SAN JOSÉ

Fecha de inicio: **06 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: **11 de Julio de 2016**

Longitud del canal: **170 Mts.**

Avance: **100%**

Volumen Desazolvado: **35 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **05** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **5,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR SAN JOSÉ



**Proceso**



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL SAN JOSÉ CALLE MÉDICOS - GEÓGRAFOS - MÉDICOS - CHINA GAVIOTAS SUR, SECTOR SAN JOSÉ



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL REVOLUCIÓN AL FINAL DE LA CALLE REVOLUCIÓN COL. ATASTA

Fecha de inicio: **12 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: **21 de Julio de 2016**

Longitud del canal: **400 Mts.**

Avance: **100%**

Volumen Desazolvado: **32 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **7** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **1,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**


COLONIA ATASTA



**Proceso**



## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL REVOLUCIÓN AL FINAL DE LA CALLE REVOLUCIÓN COL. ATASTA

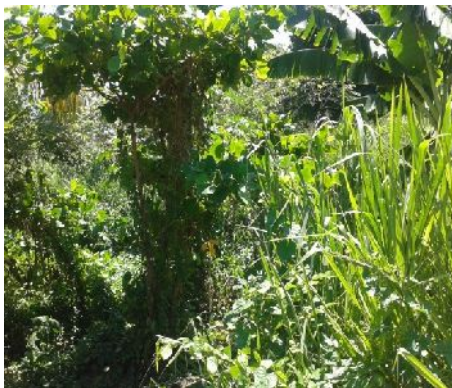

# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL CHAMACO LEIVA, COL. GAVIOTAS NORTE

Fecha de inicio: **21 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: **27 de Julio de 2016**

Longitud del canal: **180 Mts.**

Avance: **100 %**

Volumen Desazolvado: **40 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **06** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **5,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLONIA GAVIOTAS NORTE



**Antes**

**Proceso**





# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL LAGUNA DEL ESPEJO COL. MIGUEL HIDALGO

Fecha de inicio: **18 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: **22 de Julio de 2016**

Longitud del canal: **160 Mts.**

Avance: **100 %**

Volumen Desazolvado: **46 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **7 viajes** de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **5,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLONIA MIGUEL HIDALGO



**Cen**  
Antes  
somos todos  
H Ayuntamiento 2016-2018



**Proceso**



**SAS**  
Proceso  
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DUCTO CUADRADO DE CONCRETO PLUVIAL, ALFONSO VICENS SALDIVAR, COLONIA GAVIOTAS NORTE - MANGA I

Fecha de inicio: **21 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: **27 de Julio de 2016**

Longitud del canal: **470 Mts.**

Avance: **75 %**

Volumen Desazolvado: **65 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **10 viajes** de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **5,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLONIA GAVIOTAS NORTE - MANGA I



**Proceso**



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DUCTO CUADRADO DE CONCRETO PLUVIAL, ALFONSO VICENS SALDIVAR, COLONIA GAVIOTAS NORTE - MANGA I



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DUCTO CUADRADO DE CONCRETO PLUVIAL, ALFONSO VICENS SALDIVAR, COLONIA GAVIOTAS NORTE - MANGA I

Fecha de inicio: **21 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: : **3 de Agosto de 2016**

Longitud del canal: **470 Mts.**

Avance: **75 %**

Volumen Desazolvado: **65 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **10 viajes** de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **5,000** habitantes.

## Colonias Beneficiadas

COLONIA GAVIOTAS NORTE - MANGA I



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL REINO UNIDO CALLE LUXEMBURGO-IRLANDA COL. GAVIOTAS SUR

Fecha de inicio: **28 de Julio de 2016**

Fecha de Conclusión: : **3 de Agosto de 2016**

Longitud del canal: **400 Mts.**

Avance: **75 %**

Volumen Desazolvado: **42 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **6 viajes** de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **5,000** habitantes.

## Colonias Beneficiadas

COLONIA GAVIOTAS SUR



## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL MANGA III

Fecha de inicio: **28 de Julio de 2016**  
Fecha de Conclusión: : **3 de Agosto de 2016**  
Longitud del canal: **800 Mts.**  
Avance: **100 %**  
Volumen Desazolvado: **10 M<sup>3</sup>**  
Equivalente a **2** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>  
Beneficiando a **5,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLONIA MANGA III



**Antes**



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL DEL CARCAMO LIBERTAD COLONIA TAMULTE

Fecha de inicio: **28 de Julio de 2016**  
Fecha de Conclusión: : **3 de Agosto de 2016**  
Longitud del canal: **200 Mts.**  
Avance: **20 %**  
Volumen Desazolvado: **7 M<sup>3</sup>**  
Equivalente a **1** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>  
Beneficiando a **5,000** habitantes.

Colonias Beneficiadas

COLONIA TAMULTE



Antes



## LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL COLONIA ÁGUILA

Fecha de inicio: **09 de Agosto de 2016**

Fecha de Conclusión: **13 de Agosto de 2016**

Longitud del canal: **900 Mts.**

Avance: **100%**


Volumen Desazolvado: **15 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **03** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **1,000** habitantes.

**Colonias Beneficiadas**

COLONIA ÁGUILA

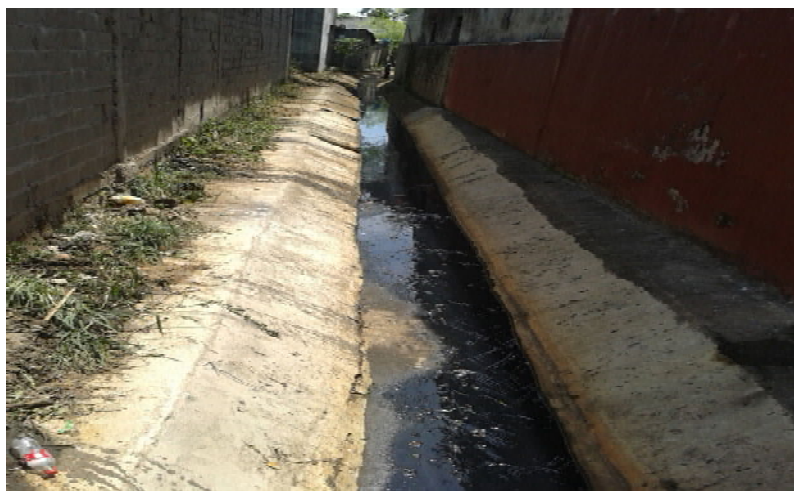



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL CANAL AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA GAVIOTAS NORTE

Colonias Beneficiadas

Fecha de inicio: **11 de Agosto de 2016**

Fecha de Conclusión: **17 de Agosto de 2016**

Longitud del canal: **155 Mts.**

Avance: **100%**

Volumen Desazolvado: **13 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **02** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **1,000** habitantes.

COLONIA GAVIOTAS NORTE



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL JOSÉ MORENO IRABIEN, COLONIA PRIMERO DE MAYO

## Colonias Beneficiadas

Fecha de inicio: **11 de Agosto de 2016**  
Fecha de Conclusión: **17 de Agosto de 2016**  
Longitud del canal: **155 Mts.**  
Avance: **100%**  
Volumen Desazolvado: **13 M<sup>3</sup>**  
Equivalente a **02** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>  
Beneficiando a **1,000** habitantes.

COLONIA PRIMERO DE MAYO



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. PRIMERO DE MAYO CANAL ATRÁS DEL FOVISSTE I, COL. FOVISSTE I

Colonias Beneficiadas

Fecha de inicio: **11 de Agosto de 2016**

Fecha de Conclusión: **17 de Agosto de 2016**

Longitud del canal: **50 Mts.**

Avance: **80%**

Volumen Desazolvado: **14 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **02** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **1,000** habitantes.

COLONIA PRIMERO DE MAYO CANAL ATRÁS DEL FOVISSTE I, COL. FOVISSTE I



# LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL A CIELO ABIERTO EJERCITO MEXICANO CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA ATASTA

Colonias Beneficiadas

Fecha de inicio: **28 de Septiembre de 2016**

COLONIA ATASTA

Fecha de Conclusión: **28 de Septiembre de 2016** Longitud del canal: **60 Mts.**

Avance: **70%**

Volumen Desazolvado: **6 M<sup>3</sup>**

Equivalente a **01** viajes de volteos de 7M<sup>3</sup>

Beneficiando a **1,000** habitantes.

